


Verteilung der Mehrkosten auf die 10 Mehrkosten-Kategorien
Kostenfortschreibung II 2022 (KF II) bezogen auf 30 Mio. €

2015 Kostenursprung:	25,1 Mio. €
<u>2019 Kostenfortschreibung I:</u>	<u>18,2 Mio. €</u>
2019 Gesamtkosten Baufeld A:	43,3 Mio. €
<u>2022 Kostenfortschreibung II:</u>	<u>30,0 Mio. €</u>
2022 Kostenfortschreibung A:	73,3 Mio. €

7) Höhere
Submissionsergebnisse
Ca. 3 Mio. € = 10%

1) Mehrkosten, die dem
Bestand geschuldet sind
ca. 7,5 Mio. Euro = 25%

6) Verspäteter Baubeginn
und Bauzeitverzögerung
ca. 9 Mio. Euro = 30%

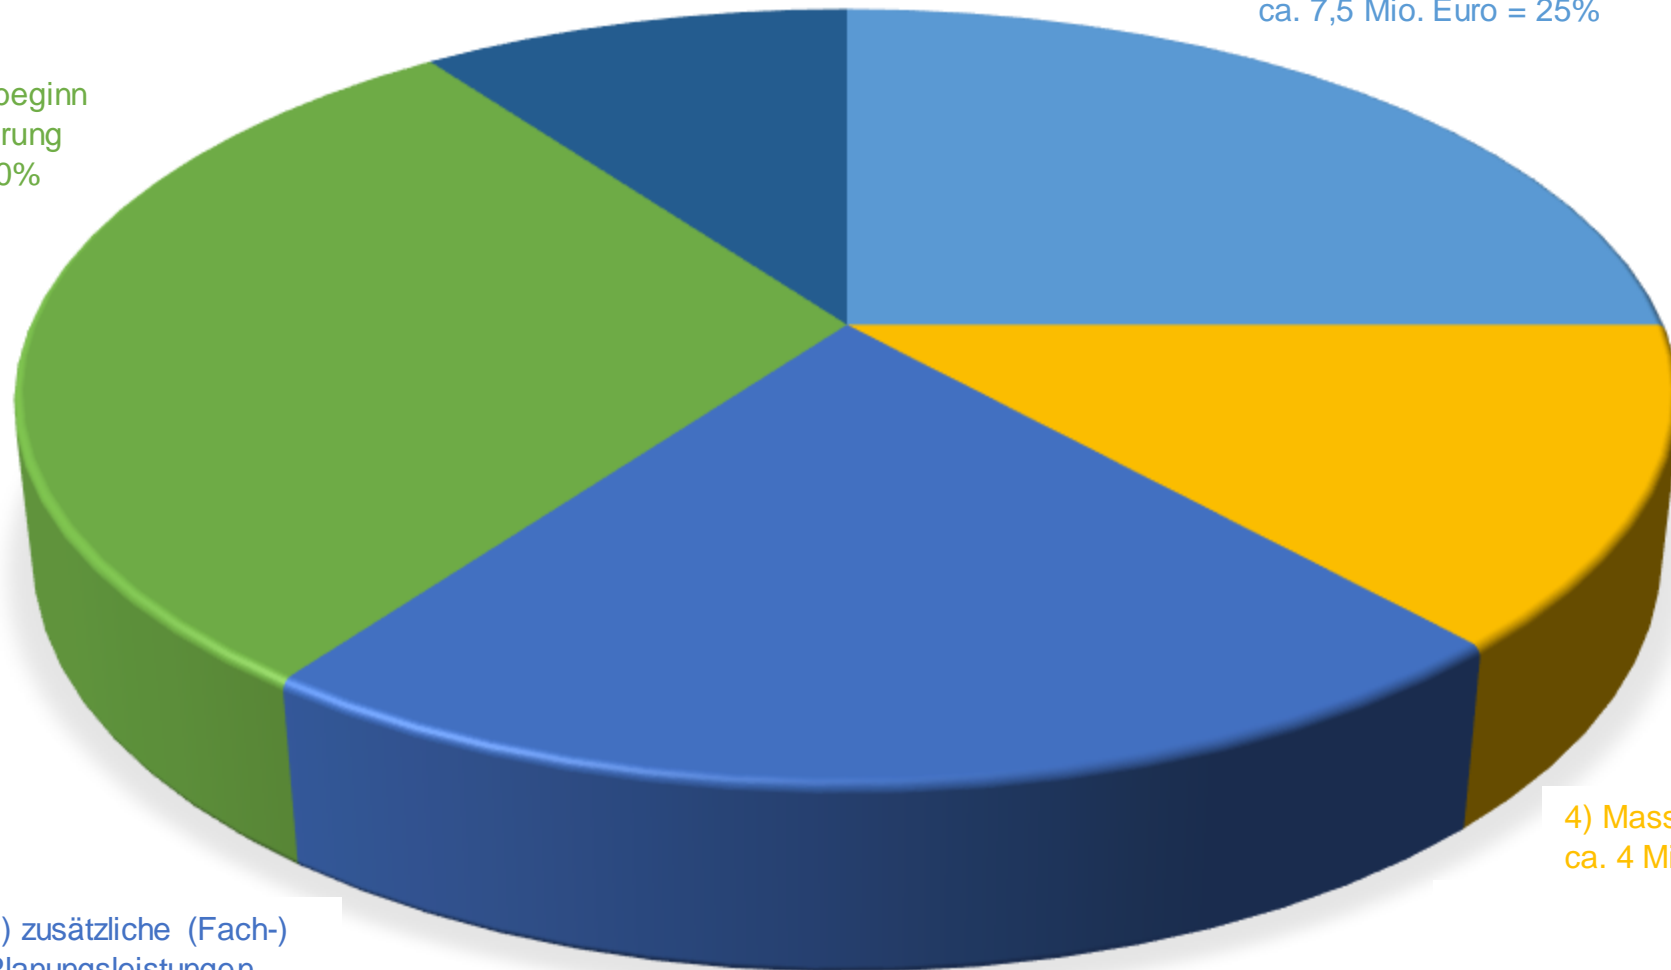

4) Massenmehrungen
ca. 4 Mio. Euro = 13,3%

5) zusätzliche (Fach-)
Planungsleistungen
ca. 6,5 Mio. € = 21,7%
