


2015 Kostenursprung : Mio € 11,366  
 2019 Kostenfortschreibung I : Mio € 4,116  
**2021 Kostenfortschreibung II : Mio € 3,820**  
 2021 Gesamtkosten Projekt : Mio € 19.302

Verteilung der Mehrkosten auf die 10 Mehrkosten-Kategorien  
**Kostenfortschreibung II 2021 (KF II) bezogen auf Mio € 3,82**

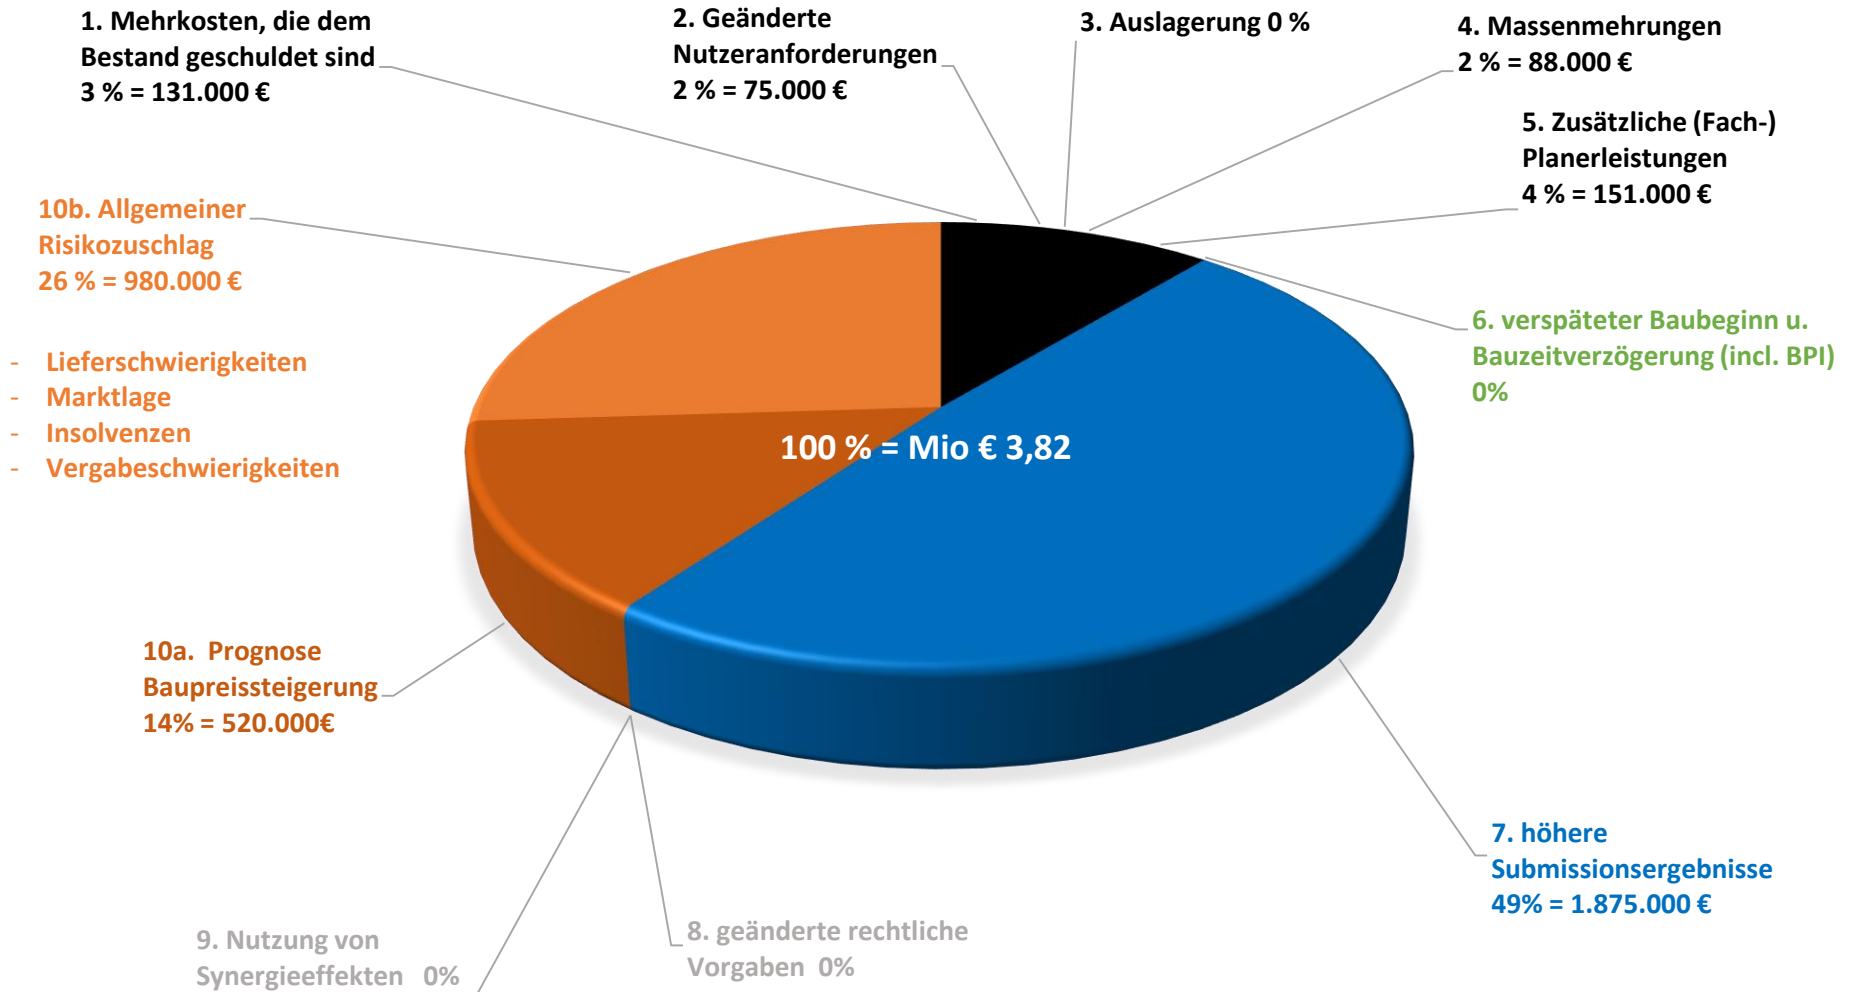

## Kostenentwicklung – Vergabeverluste aus bereits abgeschlossenen Vergaben

Gesamt: 2.875.000€ im Durchschnitt ca. 20% über Budget.

