

Sachstandsbericht
04.02.2015
31.10.2015
(im Text kursiv ergänzt)



Status	Maßnahme
1	Markierung Grüngürtel-Rundweg / Info-App
2	Narzissenpflanzungen
3	Eingang Merheimer Heide
4	Ausgleich Erweiterung BAB A 3
5	Grünzug Bocklemünd/Mengenich
6	Sitzplatz Niehler Damm
7	Sanierung der Wege rechtsrheinisch
8	Grünzug Gauweg
9	Zwischenwerk Xla, MTV-Sportanlage
10	Aufwertung Minigolfanlage Haus am See
11	Naturteichanlage Nüssenberger Busch
12	Festsetzung Ausgleich Grünzug Flittard
13	Trimm-Dich-Parcour Stadtwalderweiterung
14	Trimm-Dich-Parcour Decksteiner Weiher
15	Trimm-Dich-Parcour Beethovenpark
16	Trimm-Dich-Parcour Merheimer Heide
17	Platzgestaltung Stammheimer Schlosspark

Projektstand:

Red circle	Planungsphase
Blue circle	Ausführungsphase
Green circle	Fertigstellung

Projektliste

31.10.2015

Nr.	Projekt	Maßnahme	Planer	Bürgerbeteiligung	Planungsphase	Ausführungsphase	Kosten	Finanzierung / Paten / Sponsoren
1	Markierung Grüngürtel-Rundweg und Info-Apps	Streckenmarkierung und Herausgabe einer Karte Erstellung von Info-Apps	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl Grün Stiftung, NABU	Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/2012	Frühjahr 2013 bis 2015	Karte 2014 Info-App 2015	noch zu beziffern	Kölner Grün Stiftung LVR
2	Narzissenpflanzungen	Pflanzung von Narzissen an verschiedenen Stellen im Äußeren Grüngürtel	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	Sommer 2014 Sommer 2015	Herbst 2014 Herbst 2015	3.000 € 6.000 €	Kölner Grün Stiftung
3	Eingang Merheimer Heide	Umgestaltung einer ehemaligen Parkplatzfläche in eine Grünanlage	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/2012	Frühjahr 2014	Herbst 2014	125.000 €	Kölner Grün Stiftung
4	Ausgleich Erweiterung BAB A 3, Köln-Mülheim	Pflanzungen	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	Sommer 2013	Frühjahr 2016	181.200 €	Ausgleichsgelder Straßen NRW
5	Grünzug Bocklemünd/Mengenich	Aufwertung des Waldes und der Grünanlage durch neue Wege und Spielangebote	WGF Landschaft Nürnberg	30.10.2014 27.01.2015	Winter 2014/2015	2015	250.000 €	Kölner Grün Stiftung
6	Sitzplatz Niehler Damm	Umgestaltung zu einem attraktiven Sitzplatz	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	Vorschlag der Interessengemeinschaft Niehl	Winter 2014	2016	6.000 €	Kölner Grün Stiftung
7	Sanierung der Wege rechtsrheinisch	Sanierung von Wegen im nördlichen rechtsrheinischen Teil des Rundweges im Äußeren Grüngürtel	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	Vorschläge Bürgerhaushalt	2013/2014	2014/2015	400.000 €	Bürgerhaushalt
8	Grünzug Gauweg	Herstellung einer Wegeverbindung mit Spielplatz, Rasenflächen und Baumpflanzungen im Zuge der Wohnbebauung	Deutsche Reihenhäuser AG	keine	2014 / 2015	2016 / 2017	150.000 €	Deutsche Reihenhäuser
9	Zwischenwerk XI a, MTV-Sportanlage	Schaffung einer Wegeverbindung auf dem Gelände der MTV-Sportanlage	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/2012	2014/2015	2016	noch zu beziffern	N.N.
10	Aufwertung Minigolfanlage Haus am See	Verbesserung des Umfeldes mit Fahrradständern und Baumpflanzungen	Lill & Sparla	Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/2012	Winter 2013/2014	Frühjahr 2014	20.972 €	Bürgerhaushalt
11	Naturteichanlage Nüssenberger Busch	Anlage eines Krötenablaichgewässers mit Tonabdichtung und Umpflanzung m. dornenbewehrten Landschaftsgehölzen	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	In Zusammenarbeit mit dem NABU	Sommer 2014	Winter 2014/2015	18.000 € 4.000 €	Kölner Grün Stiftung Stadt Köln
12	Festsetzung Ausgleich Grünzug Flittard	Ausgleichsflächenpool	DB ProjektBau GmbH	keine	langfristig	langfristig	noch zu beziffern	Deutsche Bahn AG
13	Bewegungs-Parcour Stadtwalderweiterung	Ersatz für den alten Trimm-Dich-Pfad aus den 70ern	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	2011	Frühjahr 2012	47.800 €	Scherz e.V.
14	Bewegungs-Parcour Decksteiner Weiher	Diverse Geräte	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	Sportlerbefragung vor Ort	2012	Frühjahr 2013	57.000 €	Kölner Grün Stiftung
15	Bewegungs-Parcour Beethovenpark	Diverse Geräte Slackline-Pfosten	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	Frühjahr - Sommer 2014	Sommer 2014	58.000 € 18.000 €	Kölner Grün Stiftung
16	Bewegungs-Parcour Merheimer Heide	Diverse Geräte	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	Frühjahr - Sommer 2014	Oktober 2014	61.700 €	Kölner Grün Stiftung
17	Platzgestaltung Stammheimer Schlosspark	Platzgestaltung und Wegesanierung	Stadt Köln, Amt f. Landschaftspflege u. Grünfl.	keine	Sommer 2013	Herbst 2014	42.000 €	Bürgerhaushalt
18								
19								


1 Markierung Grüngürtel-Rundweg und Info-Apps

31.10.2015

Verortung



Plan/Ziel

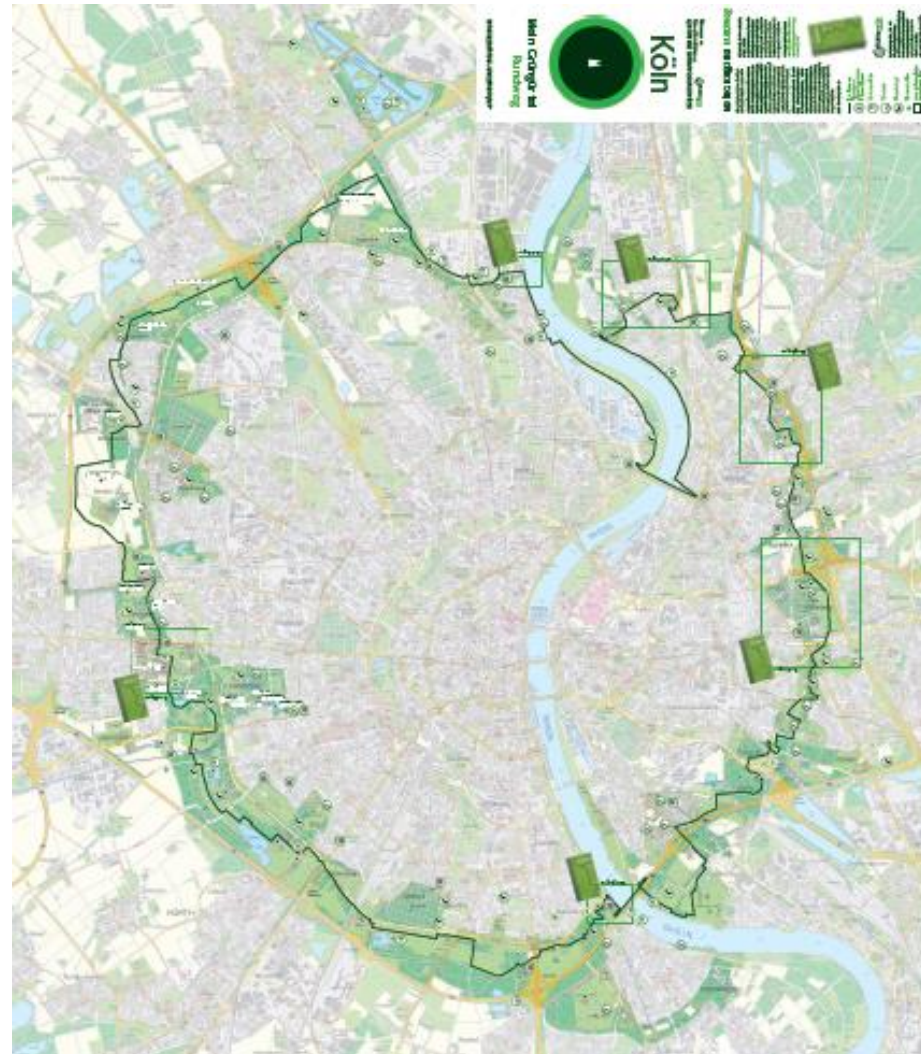

Planung:

Auf vorhandenen Wegen durch den Äußeren Grüngürtel soll ein Rundweg ausgeschildert werden. Entsprechend wurde eine Karte herausgegeben.

Informationen zu besonderen Orten sollen über einen QR-Code mit einer App abrufbar sein. Eine weitere App der Biologischen Station Leverkusen und des NABU Köln soll Familien spielerisch über besondere Orte informieren. Im Informationssystem Kultur Landschaft Digital (KuLaDig) des LVR sind die besonderen Orte beschrieben.

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen,
Greven Verlag

Kölner Grün Stiftung

Biologische Station Leverkusen, NABU Köln

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: 2011/2012

Planungsphase: **Frühjahr 2013 Rundwegkarte**

2014/2015 Markierung

2016 Info-App

Ausführungsphase: 2014 Herausgabe Rundweg-Karte

Sommer 2015 Markierung des Rundweges

2015 „Besondere Orte“ auf KuLaDig

Kosten:

Noch zu beziffern

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung: **Rundwegkarte, Info-App**


Sauerländischer Gebirgsverein: Rundwegmarkierung

Landschaftsverb. Rheinland (LVR): KuLaDig-Eintrag, Spiele-App

2 Narzissenpflanzungen im Äußeren Grüngürtel

31.10.2015

Verortung

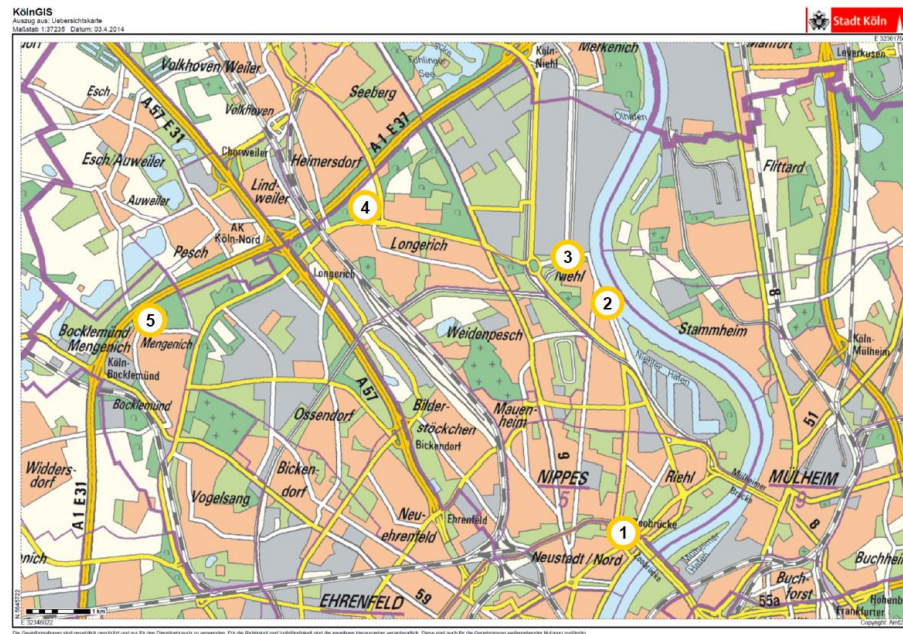

Ergebnis



Planung:

Im Äußeren Grüngürtel sollen an verschiedenen Stellen Narzissenzwiebeln gesetzt werden. Begonnen wird mit dem Abschnitt linksrheinisch Nord. ***Es folgt der Abschnitt linksrheinisch Mitte am Adenauer Weiher.***

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: Sommer 2014 **bzw. Sommer 2015**

Ausführungsphase: durch Auszubildende des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen

Oktober 2014 in Nippes und Ehrenfeld

November 2015 am Adenauer Weiher

Kosten: 3.000 € Teilabschnitt Nippes und Ehrenfeld

6.000 € Teilabschnitt Adenauer Weiher

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

3 Eingang Merheimer Heide

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Plan/Ziel



Ergebnis



Maßnahmen:

Umgestaltung des ehemaligen Parkplatzes zu einer Grünanlage mit Wegeverbindungen und Gehölzpflanzungen als Eingangsbereich für die Sportanlagen und die Merheimer Heide.

Planung:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/12

Planungsphase: Frühjahr 2014

Ausführungsphase: Herbst 2014 durch Auszubildende des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen

Fertigstellung: April 2015

Kosten: 125.000 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

4 Ausgleich Erweiterung BAB A 3, Köln-Mülheim

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Plan/Ziel



Planung:

Baumpflanzungen und Anlage von Wiesenflächen

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: Sommer 2013

Ausführungsphase: **Frühjahr 2016**

Kosten: 181.200 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kompensationsmaßnahme Straßen NRW

5 Grünzug Bocklemünd/Mengenich

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Plan/Ziel



Planung:

Aufwertung des Waldes und der Grünanlage durch neue Wege und Spielangebote

Planer:

WGF Landschaft Nürnberg

Zeitablauf:

Bürgerworkshop: 30.10.2014, 27.01.2015

Planungsphase: Winter 2014 – Frühjahr 2015

Ausführungsphase: **ab Anfang 2016** durch Auszubildende des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen

Kosten:

Grünanlage: 250.000 €

Spielgeräte: noch zu beziffern durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie

Finanzierung/Paten/Sponsoren:


Grünanlage: Kölner Grün Stiftung

Spielgeräte: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Verortung



Vorhandene Situation

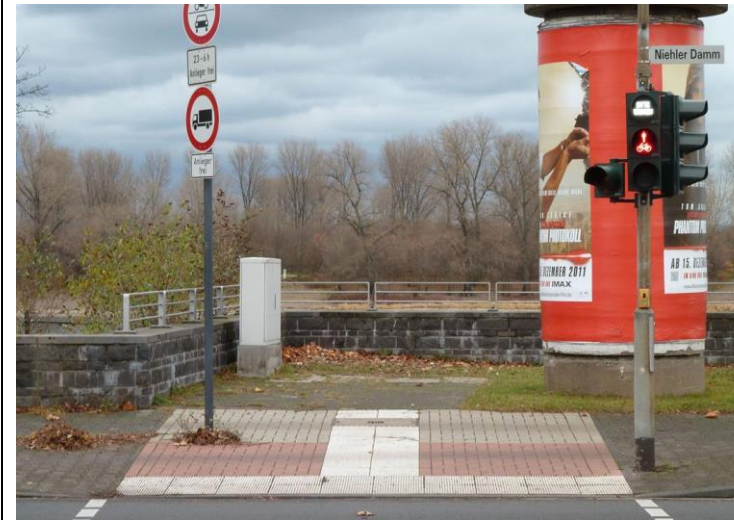

Plan/Ziel



Planung:

Umgestaltung zu einem attraktiven Sitzplatz

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Anfrage mit Gestaltungsvorschlag der Interessengemeinschaft Niehl

Planungsphase: Winter 2014

Ausführungsphase: **2016**

Kosten: 6.000 €


Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

7 Sanierung der Wege rechtsrheinisch

31.10.2015

Verortung

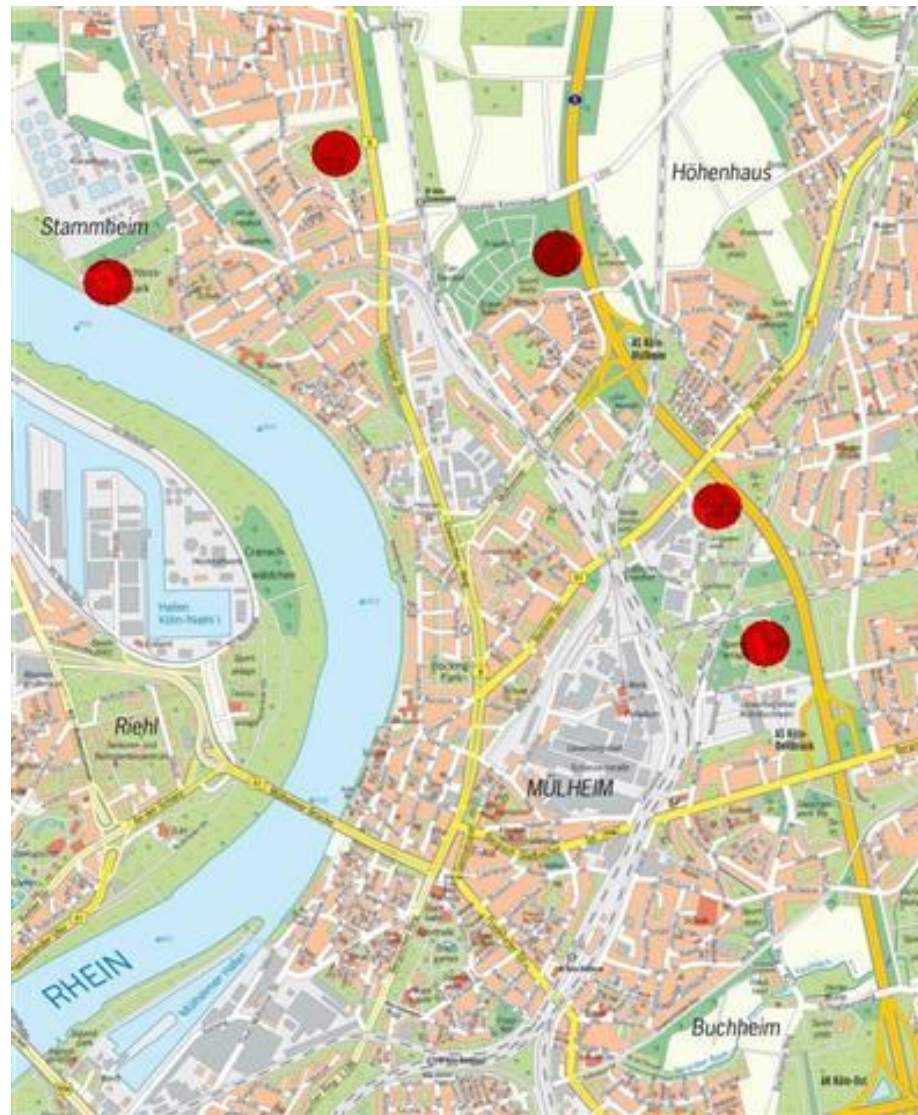

Vorhandene Situation



Ergebnis



Planung:

Sanierung von Wegen mit Rasenbankett im nördlichen rechtsrheinischen Teil des Rundweges im Äußeren Grüngürtel

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt

Planungsphase: 2013/2014


Ausführungsphase: 2014/2015

Kosten: 400.000 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Bürgerhaushalt

Verortung

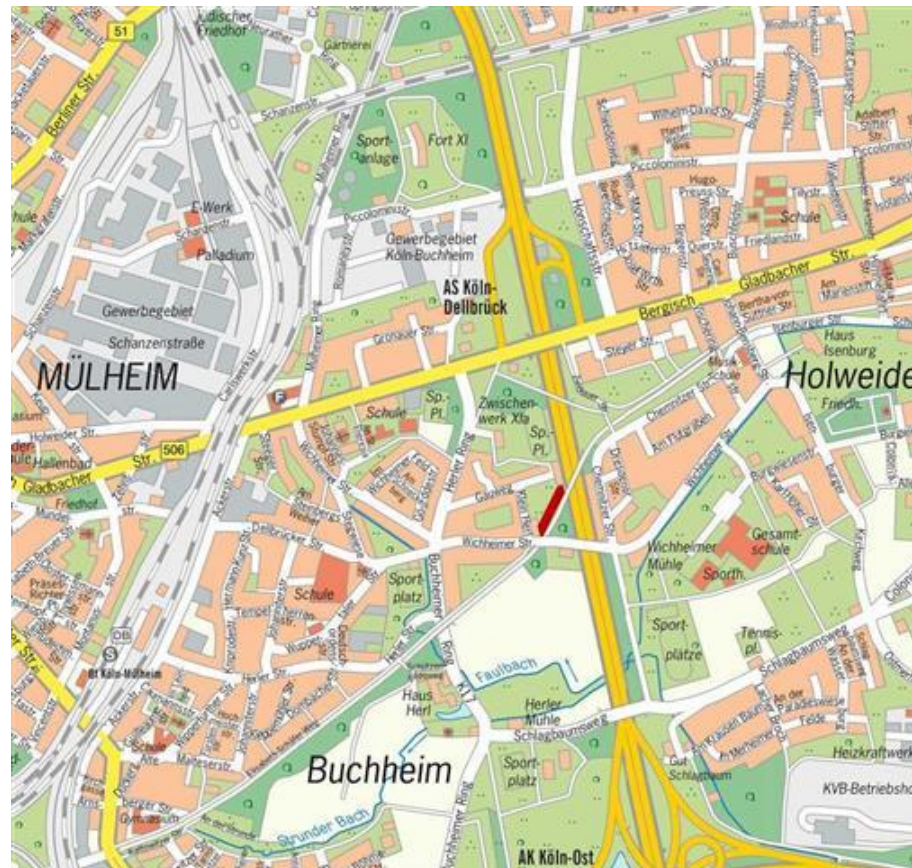

Vorhandene Situation



Plan/Ziel



Planung:

Im Rahmen der Bauleitplanungsaufgabe „Gauweg“ wird der Grünzug Gauweg rechtsverbindlich festgesetzt. Geplant sind eine Wegeverbindung, ein Spielplatz sowie Rasenflächen und Baumpflanzungen

Planer:

Deutsche Reihenhäuser AG

Zeitablauf:

Planungsphase: **2014 / 2015**

Ausführungsphase: **2016 / 2017**

Kosten:

Ca. 150.000 €


Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Deutsche Reihenhäuser AG

9 Zwischenwerk Xla, MTV-Sportanlage

31.10.2015

Verortung

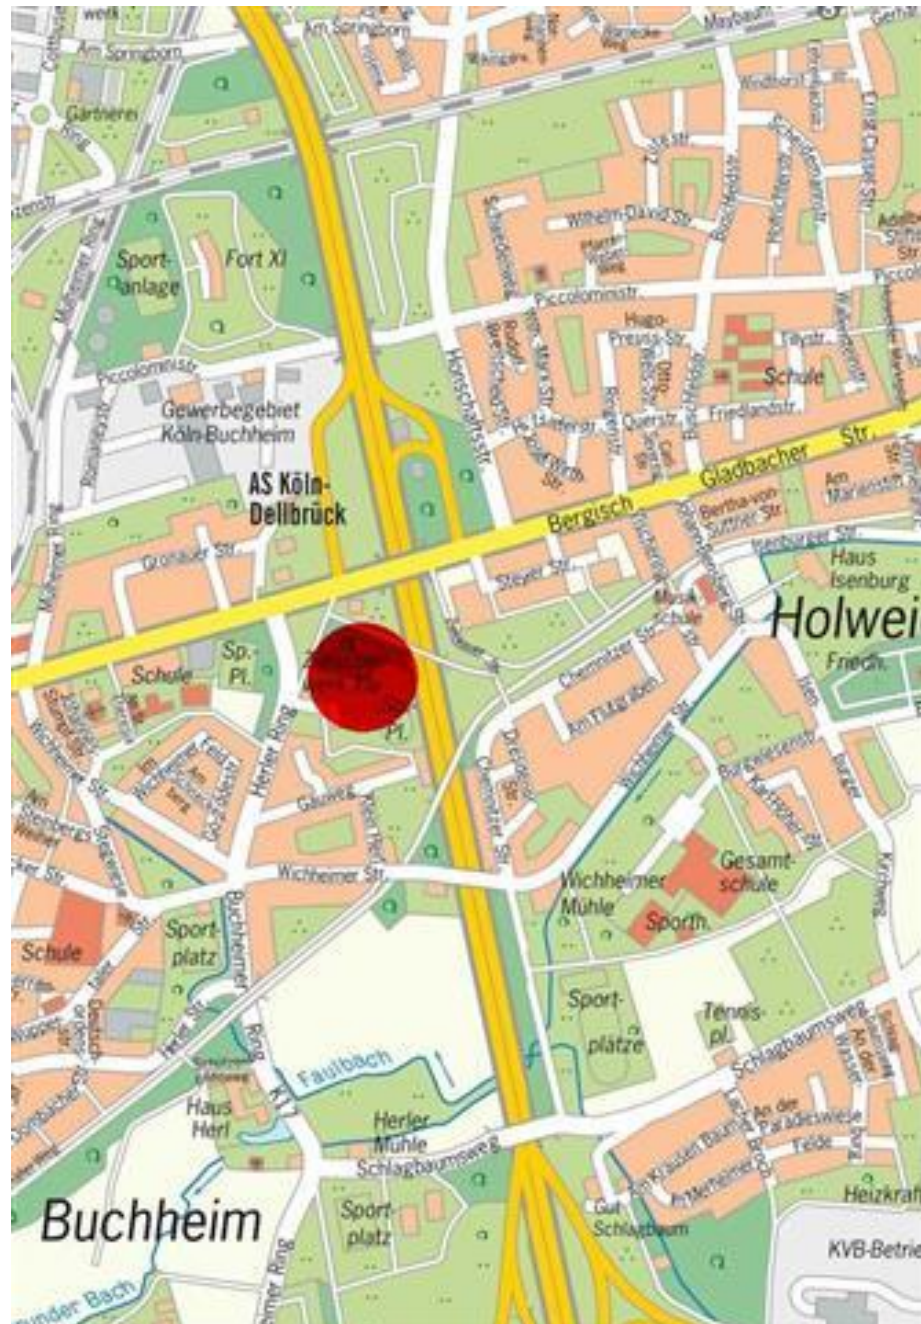

Vorhandene Situation



Plan/Ziel



Planung:

Schaffung einer Wegeverbindung vom Grünzug Gauweg über das Fort-Gelände bis zur Kreuzung Herler Ring mit Gladbacher Straße auf dem Gelände der MTV-Sportanlage

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/12

Planungsphase: 2014/2015

Ausführungsphase: **2016**

Kosten:

Noch zu beziffern

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

N.N.

10 Aufwertung Minigolfanlage Haus am See

31.10.2015


Verortung



Vorhandene Situation



Plan/Ziel

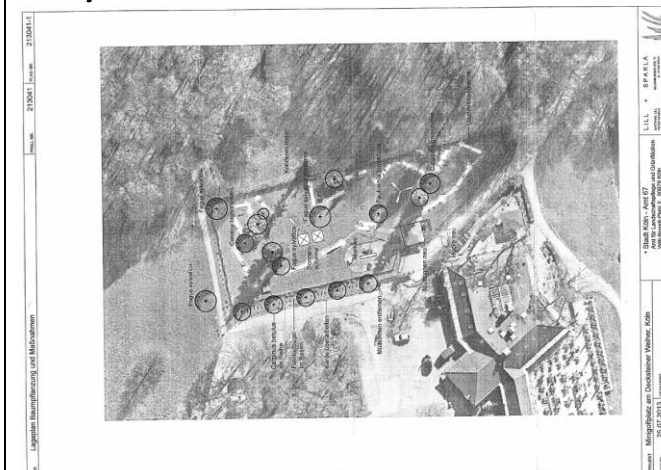

Ergebnis



Planung:

Verbesserung des Umfeldes des Minigolfplatzes am Haus am See mit Fahrradständern und Baumpflanzungen

Planer:

Lill & Sparla

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Werkstatt Grüngürtel Impuls Köln 2011/12

Planungsphase: Winter 2013/2014

Ausführungsphase: Frühjahr 2014

Kosten: 20.972 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Bürgerhaushalt

11 Naturteichanlage Nüssenberger Busch

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Ergebnis

Stand 01/15



Planung:

Im Landschaftsschutzgebiet Nüssenberger Busch wird ein Krötenablaichgewässer mit Tonabdichtung und Schutzschicht aus Sand und Perlkies angelegt. Mit einem Zaun und dornenbewehrten Landschaftsgehölzen (Schlehe, Weißdorn, Hundsrose) wird der Teich abgesichert.

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen in Zusammenarbeit mit NABU Leverkusen Köln e.V.

Zeitablauf:

Planungsphase: Sommer 2014

Ausführungsphase: Winter 2014/2015

Kosten:

Teichbau: 18.000 €

Schutzzaun und Pflanzung: 4.000 €


Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Teichbau: 18.000 € gesponsert von der Kölner Grün Stiftung

12 Festsetzung Ausgleich Grünzug Flittard

31.10.2015


Verortung

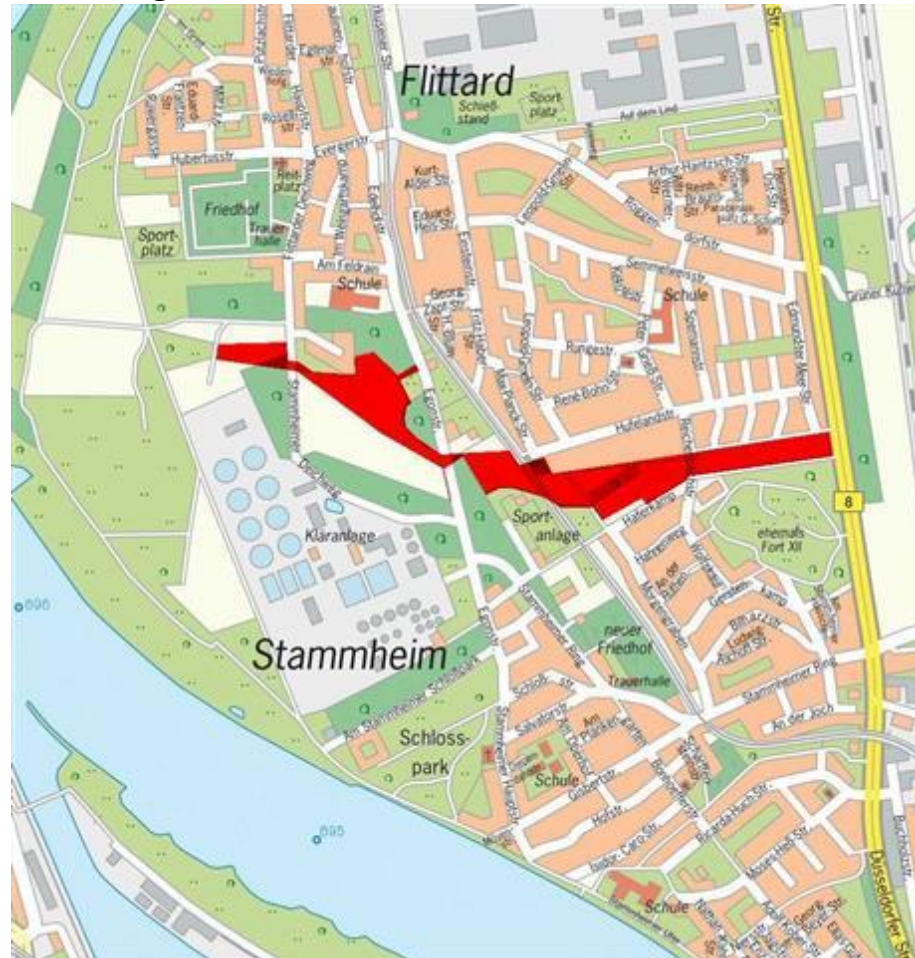

Vorhandene Situation



Plan/Ziel

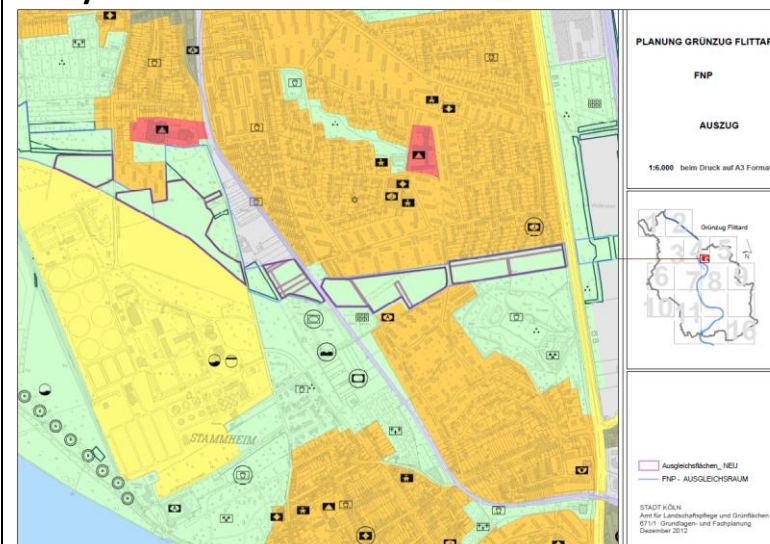

Planung:

Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen zum Ausbau des Grünzugs Flittard.

Planer:

DB ProjektBau GmbH

Zeitablauf:

Planungsphase: langfristig

Ausführungsphase: langfristig

Kosten:

Noch nicht beziffert

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Deutsche Bahn AG

13 | Bewegungs-Parcours Stadtwalderweiterung

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Ergebnis



Planung:

Diverse Geräte als Ersatz für den alten Trimm-Dich-Pfad aus den 1970er Jahren

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: 2011

Ausführungsphase: Frühjahr 2012

Kosten: 47.800 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Matthias Scherz e.V.

14 Bewegungs-Parcours Decksteiner Weiher

31.10.2015


Verortung



Vorhandene Situation



Plan/Ziel

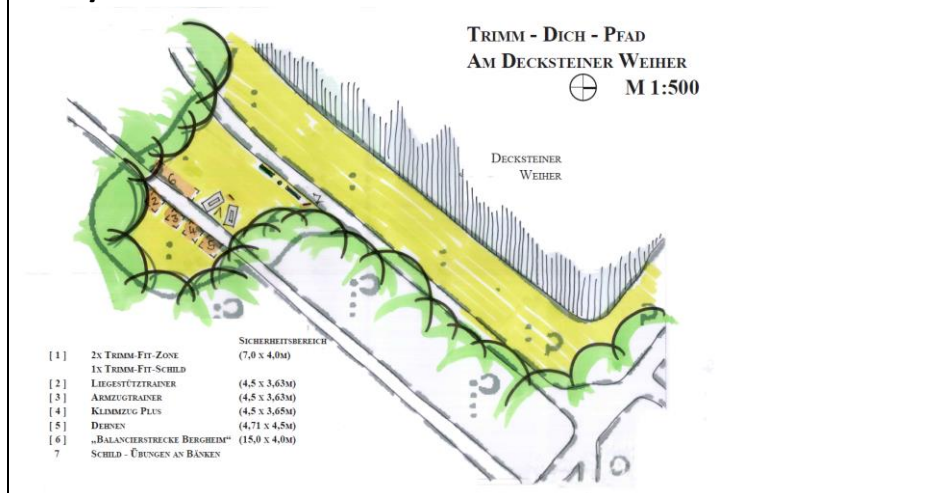

Ergebnis



Planung:

Bewegungsparcours mit diversen Geräte

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Bürgerbeteiligung: Sportlerbefragung vor Ort

Planungsphase: 2012

Ausführungsphase: Frühjahr 2013

Kosten: 57.000 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

15 | Bewegungs-Parcours Beethovenpark

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Ergebnis



Planung:

Bewegungsparcours mit diversen Geräte und Slackline-Pfosten

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: Frühjahr bis Sommer 2014

Ausführungsphase: Sommer 2014

Kosten: 76.000 €



Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

16 | Bewegungs-Parcours Merheimer Heide

31.10.2015

Verortung

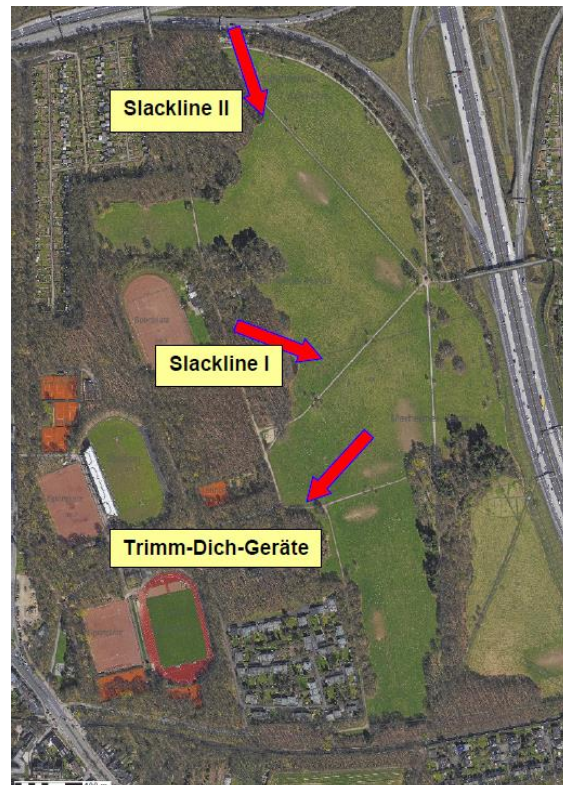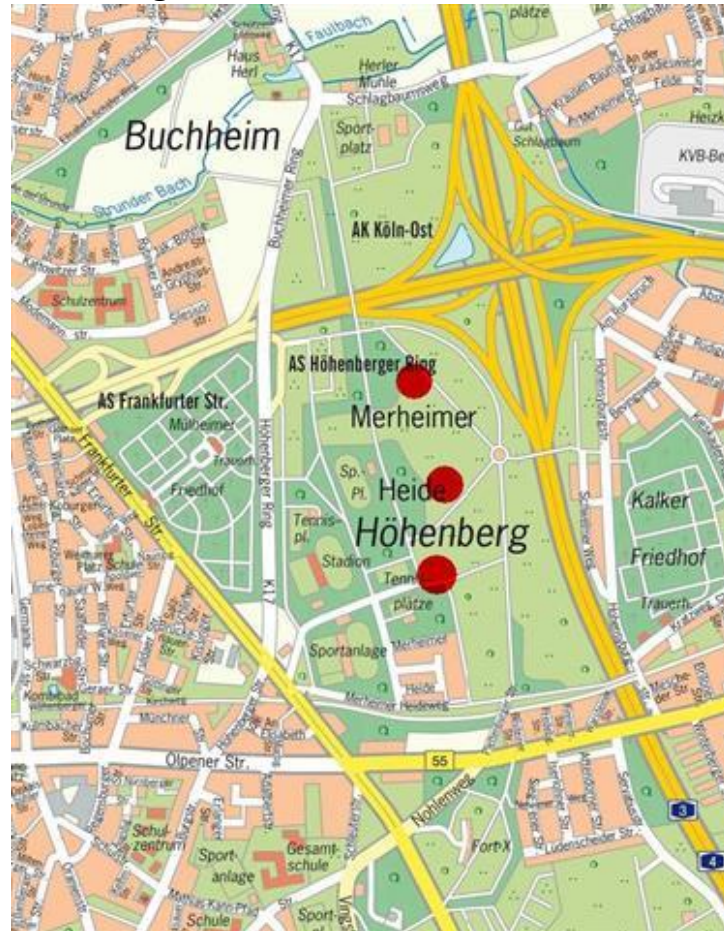

Vorhandene Situation



Ergebnis



Planung:

Bewegungsparcours mit diversen Geräte

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: Frühjahr bis Sommer 2014

Ausführungsphase: Oktober 2014

Kosten: 61.700 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Kölner Grün Stiftung

17 Platzgestaltung Stammheimer Schlosspark

31.10.2015

Verortung



Vorhandene Situation



Ergebnis



Planung:

Herstellung einer Platzfläche und Wegesanierung

Planer:

Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Zeitablauf:

Planungsphase: Sommer 2013

Ausführungsphase: Herbst 2014

Kosten: 42.000 €

Finanzierung/Paten/Sponsoren:

Bürgerhaushalt
