Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1					
2	**1.01**	**Gerüstbauarbeiten**	**318 Tage**	**04.11.10**	**08.02.12**
9	**1.04**	**Rohbauarbeiten**	**184,6 Tage**	**03.02.11**	**31.10.11**
10	**1.04.1**	**Bauteil A**	**95 Tage**	**01.03.11**	**20.07.11**
19	**1.04.2**	**Bauteil Aula**	**69 Tage**	**01.03.11**	**10.06.11**
25	**1.04.3**	**Bauteil B**	**154,6 Tage**	**03.02.11**	**16.09.11**
29	**1.04.4**	**Bauteil B / Treppenhaus**	**120 Tage**	**01.04.11**	**22.09.11**
34	**1.04.5**	**Bauteil C**	**63 Tage**	**01.03.11**	**01.06.11**
37	**1.04.6**	**Bauteil D**	**97 Tage**	**01.03.11**	**22.07.11**
44	**1.04.7**	**Bauteil E**	**124 Tage**	**26.04.11**	**20.10.11**
51	**1.04.8**	**Restarbeiten BE-räumen**	**112 Tage**	**23.05.11**	**31.10.11**
55	**1.05**	**Fenster, Restleistungen**	**211 Tage**	**16.05.11**	**15.03.12**
58	**1.06**	**Putz 1 - Restleistungen**	**30 Tage**	**09.09.11**	**21.10.11**
60	**1.07**	**Fliesen 1 - Innenfensterbänke**	**30 Tage**	**24.10.11**	**05.12.11**
62	**1.10**	**Trockenbau 1**	**100 Tage**	**07.07.11**	**25.11.11**
64	**1.11**	**Estricharbeiten**	**30 Tage**	**28.11.11**	**09.01.12**
66	**1.12**	**Gussasphalt**	**20 Tage**	**10.01.12**	**06.02.12**
68	**1.18**	**Bestandsuntersuchungen**	**40 Tage**	**03.01.11**	**25.02.11**
70	**1.19.1**	**Sonnenuhr Demontage**	**5 Tage**	**20.01.11**	**26.01.11**
72	**1.19.2**	**Sonnenuhr Remontage**	**10 Tage**	**18.10.11**	**31.10.11**
74	**1.20**	**Blindgänger De- und Remontage Container**	**43 Tage**	**14.02.11**	**15.04.11**
79	**2.01**	**Stahlbau Dach Aula**	**101 Tage**	**03.06.11**	**26.10.11**
87	**2.02**	**Betonsanierung incl. Sanierung + Dämmung Kellerböden**	**71 Tage**	**03.05.11**	**12.08.11**
94	**2.03**	**Natursteinarbeiten**	**50 Tage**	**24.10.11**	**03.01.12**
96	**2.04**	**Fassadensanierung**	**116 Tage**	**03.05.11**	**17.10.11**
103	**2.05**	**Dachdecker- + Zimmerarbeiten**	**155 Tage**	**27.06.11**	**01.02.12**
109	**2.06**	**Innentüren, Türen und Zargen**	**266 Tage**	**26.04.11**	**16.05.12**
114	**2.07**	**Tischlerarbeiten**	**60 Tage**	**01.02.12**	**30.04.12**
116	**2.08**	**Metallbauarbeiten (RP-Fassaden, Stahlglastüren)**	**181 Tage**	**27.04.11**	**12.01.12**
126	**2.09**	**Glasbausteinfassade Sporthalle**	**40 Tage**	**21.07.11**	**14.09.11**
128	**2.10**	**Sanierung Bleiverglasung**	**30 Tage**	**27.10.11**	**08.12.11**
130	**2.11**	**Schlosserarbeiten**	**60 Tage**	**04.01.12**	**29.03.12**
132	**2.12**	**Brandschutzputz**	**80 Tage**	**29.06.11**	**19.10.11**

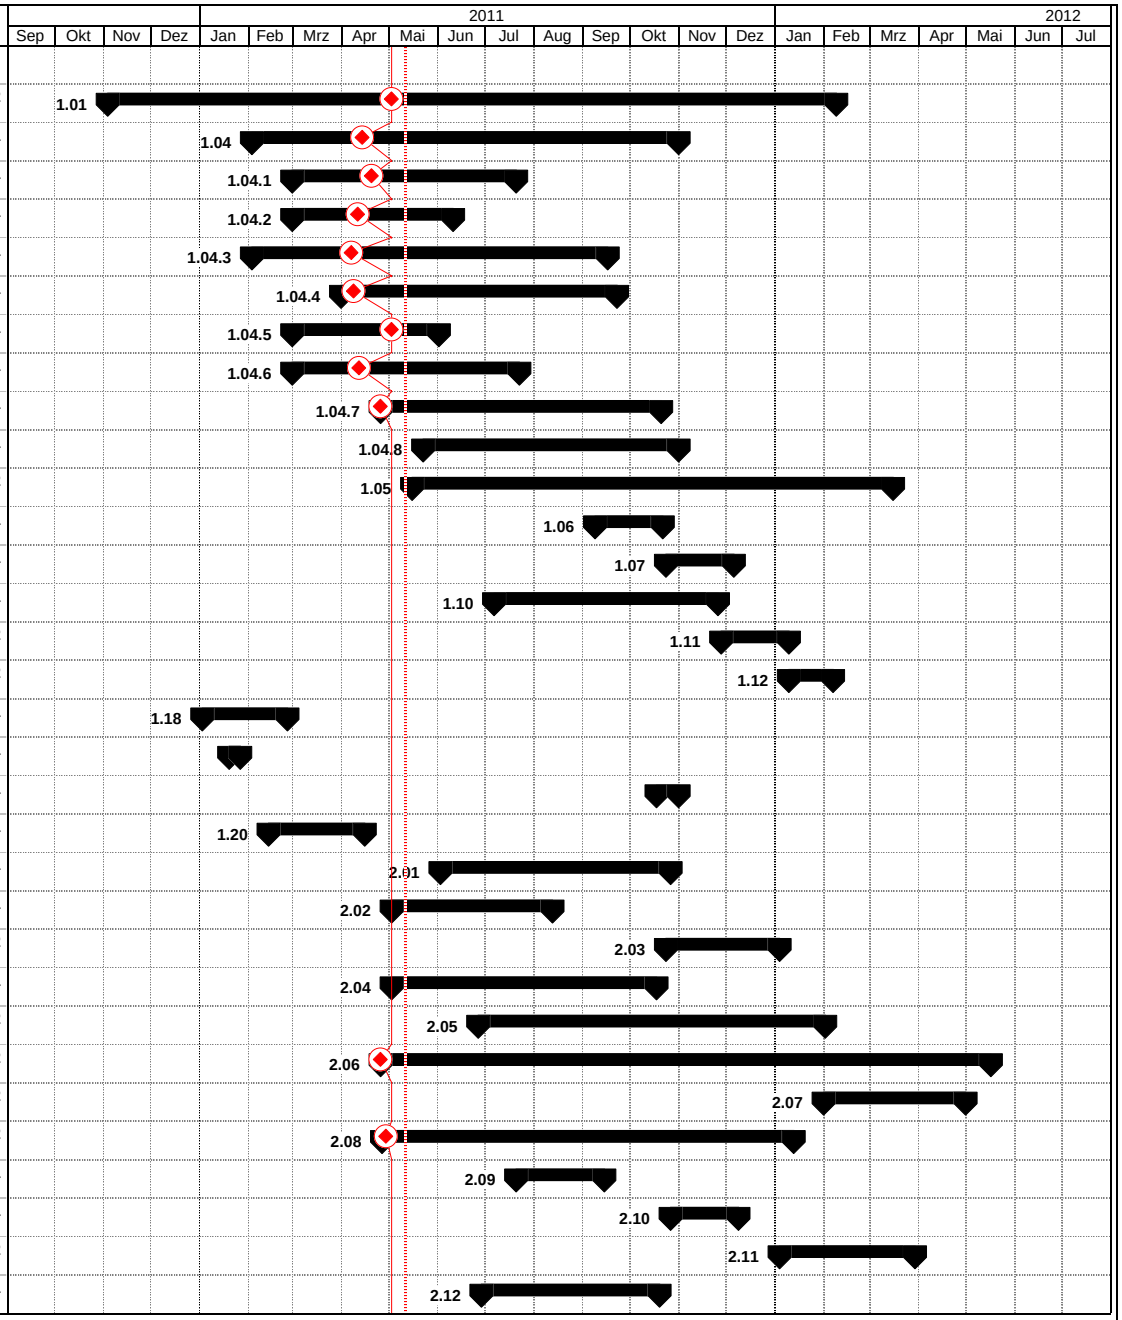
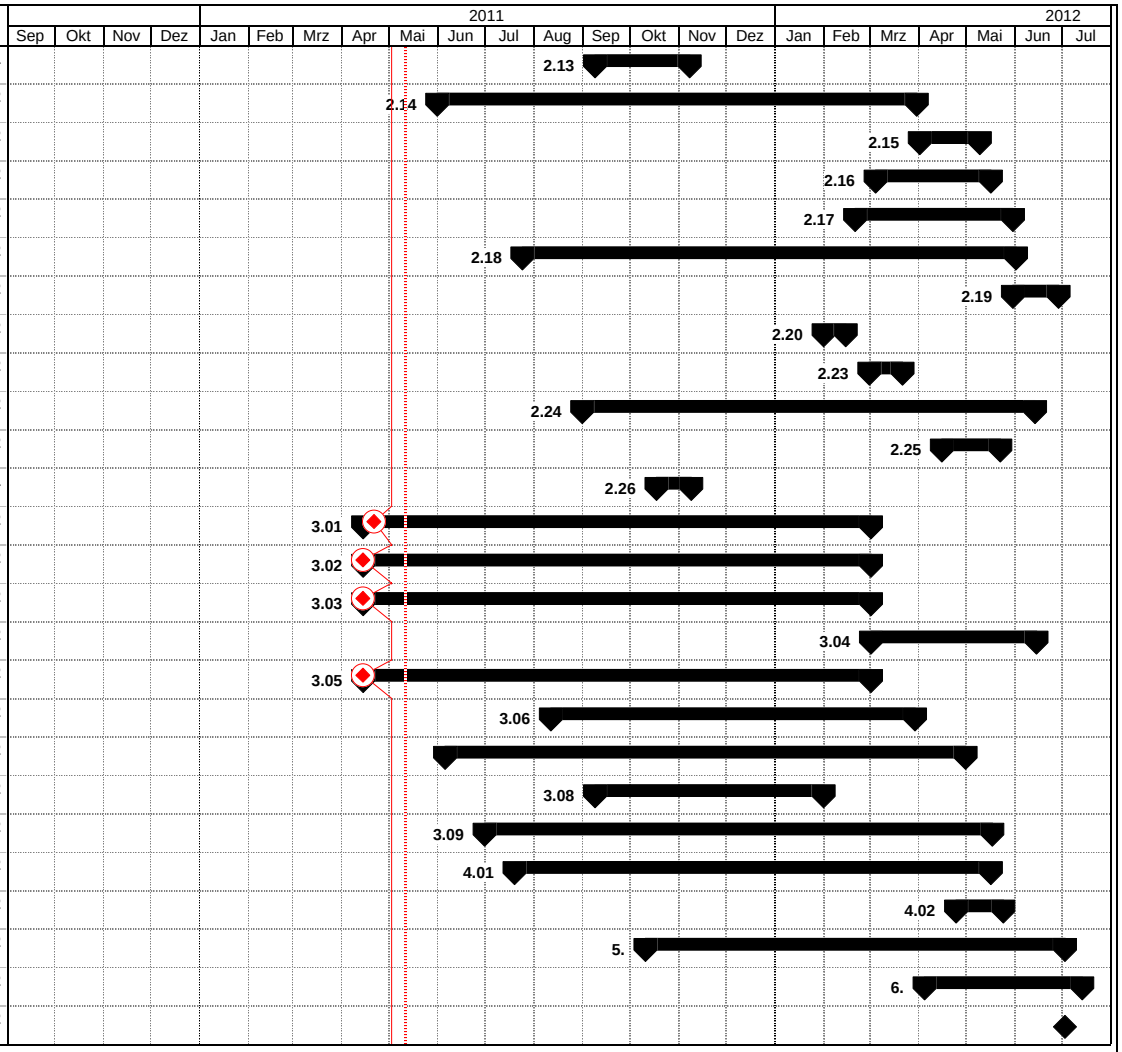
Nr.	Text1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
134	**2.13**	**Fliesenarbeiten 2**	**40 Tage**	**09.09.11**	**07.11.11**
136	**2.14**	**Trockenbauarbeiten 2 Decke Turnhalle + Aula**	**210 Tage**	**01.06.11**	**30.03.12**
140	**2.15**	**Bodenbelagsarbeiten**	**25 Tage**	**02.04.12**	**09.05.12**
142	**2.16**	**Anstricharbeiten**	**50 Tage**	**05.03.12**	**16.05.12**
144	**2.17**	**Parkett- /Holzpflasterarbeiten**	**67 Tage**	**21.02.12**	**30.05.12**
147	**2.18**	**Sporthallenboden**	**215 Tage**	**25.07.11**	**01.06.12**
150	**2.19**	**Bestuhlung / festeingebaute Möblierung**	**20 Tage**	**31.05.12**	**28.06.12**
152	**2.20**	**WC-Trennwände**	**10 Tage**	**01.02.12**	**14.02.12**
154	**2.23**	**Beschlagsarbeiten**	**15 Tage**	**01.03.12**	**21.03.12**
156	**2.24**	**Sportgeräte**	**194 Tage**	**01.09.11**	**13.06.12**
159	**2.25**	**Grundreinigung**	**25 Tage**	**16.04.12**	**22.05.12**
161	**2.26**	**Remontage Ikarus**	**15 Tage**	**18.10.11**	**08.11.11**
163	**3.01**	**Sanitär (Wasser, Abwasser, Feuerlöschtech.)1**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
166	**3.02**	**Heizung einschl. Wärmedämmung 2. Lauf**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
169	**3.03**	**Elektr. Strom, Blitzschutz + Nachricht.-Technik**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
172	**3.04**	**Bühnen- und Medientechnik**	**69 Tage**	**02.03.12**	**14.06.12**
176	**3.05**	**Raumlufttechnik**	**220 Tage**	**15.04.11**	**01.03.12**
179	**3.06**	**Fördertechnik (Aufzug)**	**160 Tage**	**12.08.11**	**29.03.12**
182	**3.07**	**MSR / GLT**	**227 Tage**	**06.06.11**	**30.04.12**
185	**3.08**	**Rohr- und Kanaldämmungen**	**100 Tage**	**09.09.11**	**31.01.12**
187	**3.09**	**Kanalbau**	**221 Tage**	**01.07.11**	**18.05.12**
196	**4.01**	**Orgel**	**208 Tage**	**20.07.11**	**16.05.12**
199	**4.02**	**Labormöbel**	**20 Tage**	**25.04.12**	**24.05.12**
201	**5.**	**Landschaftsbau**	**180 Tage**	**11.10.11**	**02.07.12**
210	**6.**	**Abnahmen und Übergaben**	**66 Tage**	**05.04.12**	**13.07.12**
214	**7.**	**Offene Punkte**	**0 Tage**	**03.07.12**	**03.07.12**
