ANLAGE 04

Konzeption Historischer Park
Rahmenterminplanung

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

RAHMENTERMINPLANUNG HISTORISCHER PARK

ENTWURF: Stand 19.05.2011
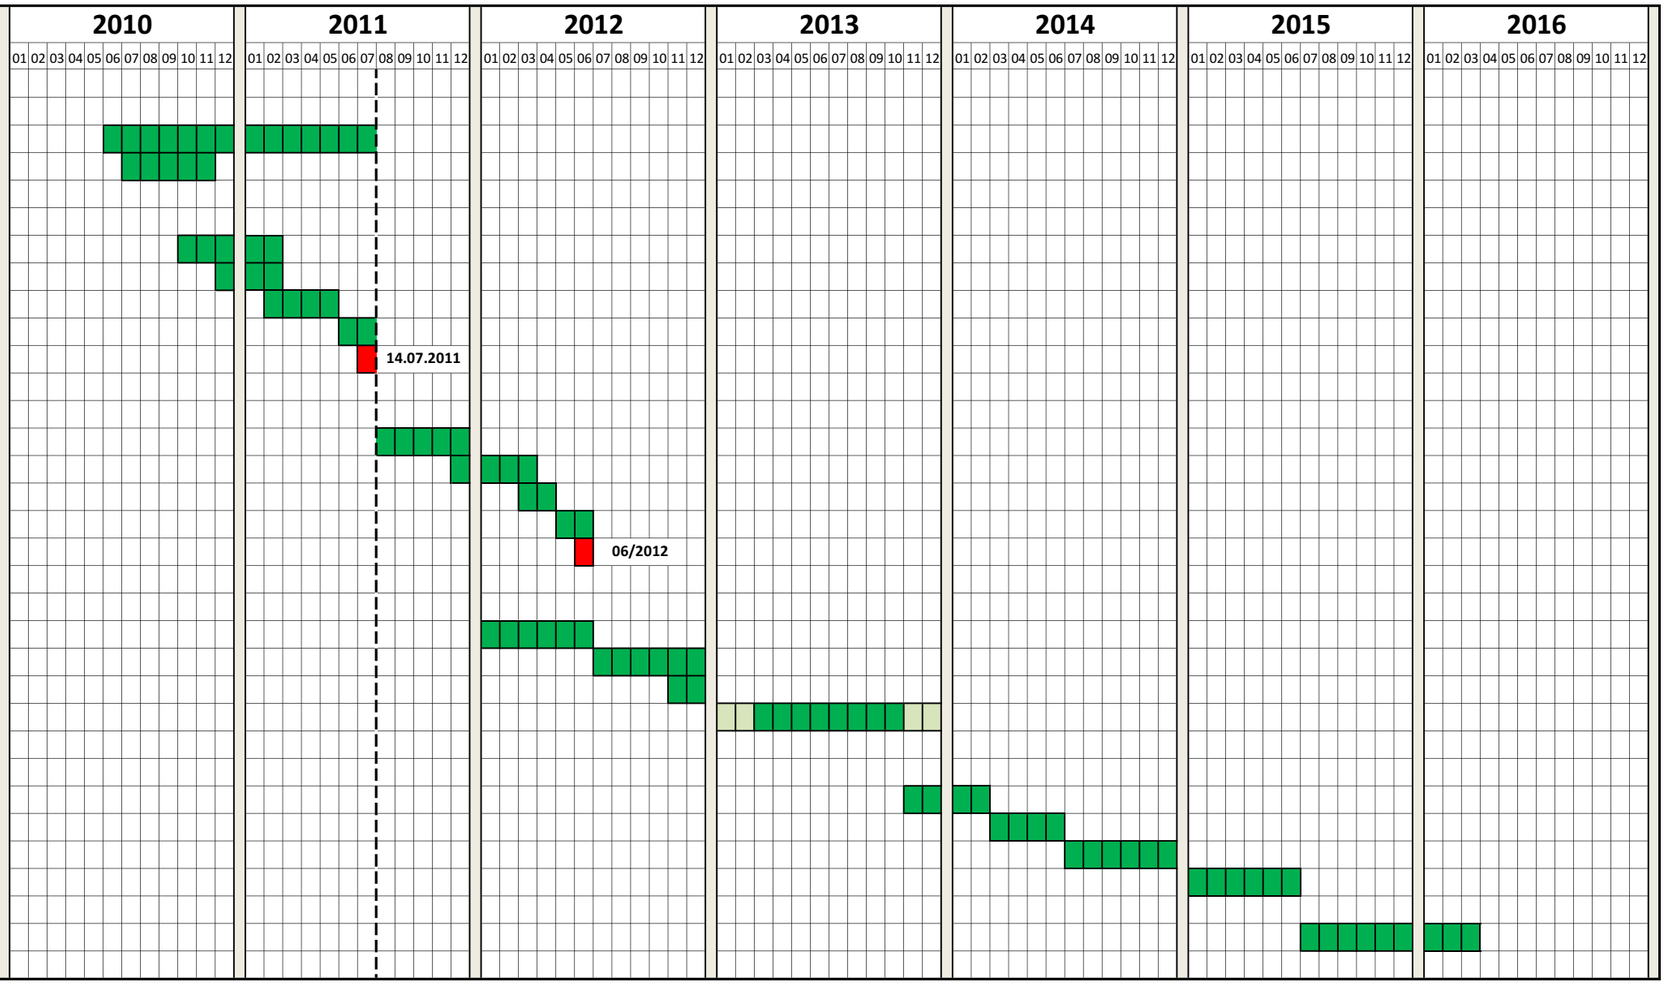
	Dauer [Monate]
1. BA (Dammrückbau + HWS):	
Ausführung	
HWS-Wand: Rettungsgrabung RGM + Dokumentation	
Ratsbeschluss I: Moderationsverfahren u. Großgrabung	
Entwicklung Konzeption Archäologie **(LPH 1 + 2)**	5
Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Gremien	3
Erarbeitung Ratsvorlage	4
Mitzeichnungsverfahren/Gremien	2
Ratsbeschluss I (14.07.2011)	
Ratsbeschluss II: Entwurfsplanung Historischer Park	
Moderationsverfahren Historischer Park **(LPH 1 + 2)**	5
Entwurfsplanung **(LPH 3)**	4
Erarbeitung Ratsvorlage	2
Mitzeichnungsverfahren	2
Ratsbeschluss II (ca. Juni 2012)	
Großgrabung:	
Gespräche mit Zuschussgeber/Finanzierungszusage	6
Ausschreibung + Vergabe Bauleistungen	6
Antrag auf Befreiung von der Deichschutzverordnung	2
Ausführung (Zeitbedarf: 8 Monate)	8 von 12
Fortführung Planung:	
Anpassung Entwurfsplanung **(LPH 3)** inf. Großgrabung	4
Baurecht	4
Ausführungsplanung **(LPH 4 + 5)**	6
Ausschreibung und Vergabe **(LPH 6 + 7)**	6
Ausführung 3. BA	9
