Michael Schumann
Dipl. Ing. Architekt

General-Sanierung Grundschule Flittard, Am Feldrain 10
Grobterminplan für Planung, Ausschreibung Vergabe und Ausführung

Stand 27.11.2013
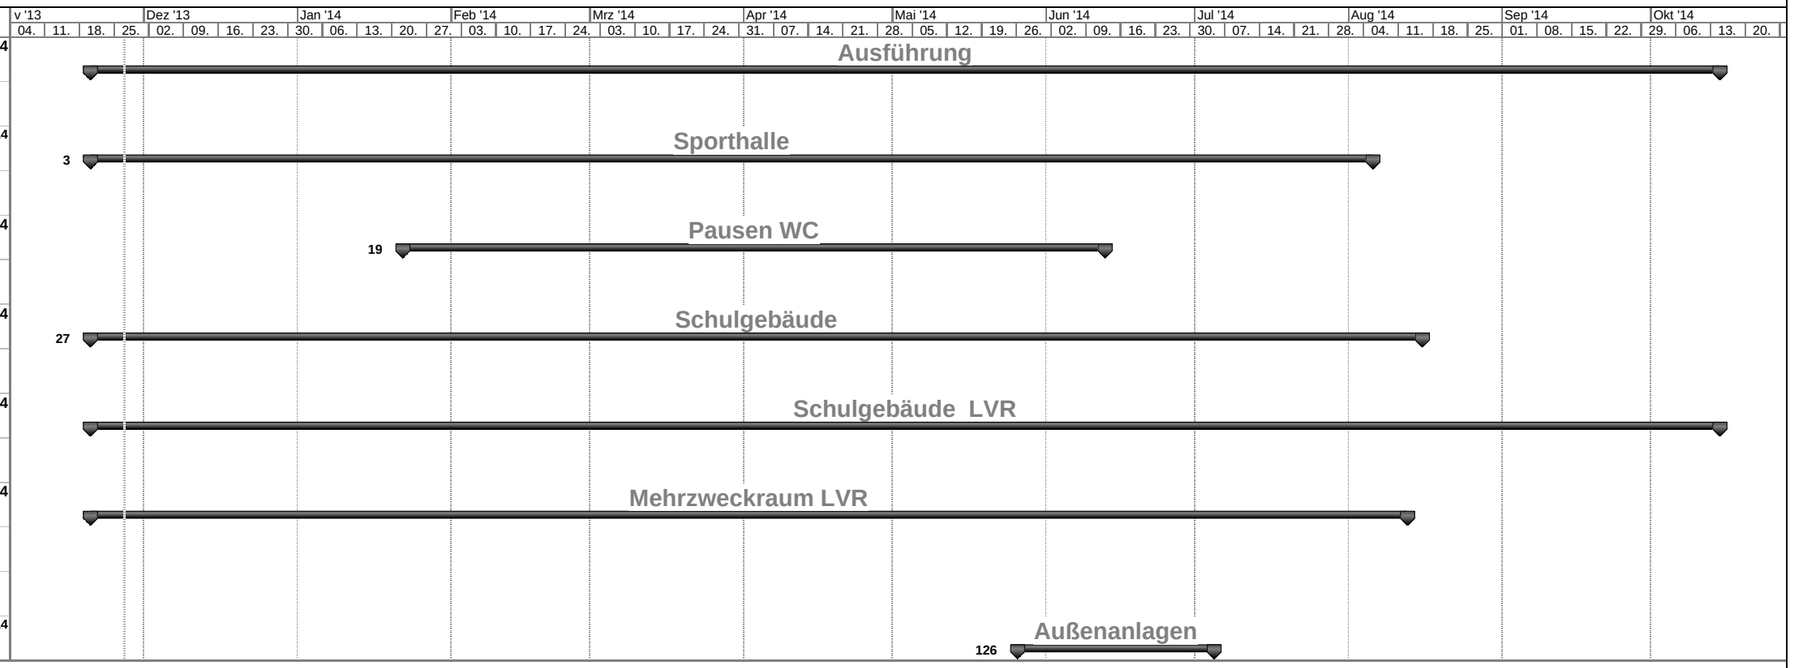
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Ausführung**	224 Tage	Mi 20.11.13	Di 14.10.14
2				
3	Sporthalle	174 Tage	Mi 20.11.13	Di 05.08.14
18				
19	Pausen WC	102 Tage	Mi 22.01.14	Do 12.06.14
26				
27	Schulgebäude	182 Tage	Mi 20.11.13	Fr 15.08.14
68				
69	Schulgebäude LVR	224 Tage	Mi 20.11.13	Di 14.10.14
110				
111	Mehrzweckraum LVR	179 Tage	Mi 20.11.13	Di 12.08.14
124				
125				
126	Außenanlagen	30 Tage	Mo 26.05.14	Fr 04.07.14
