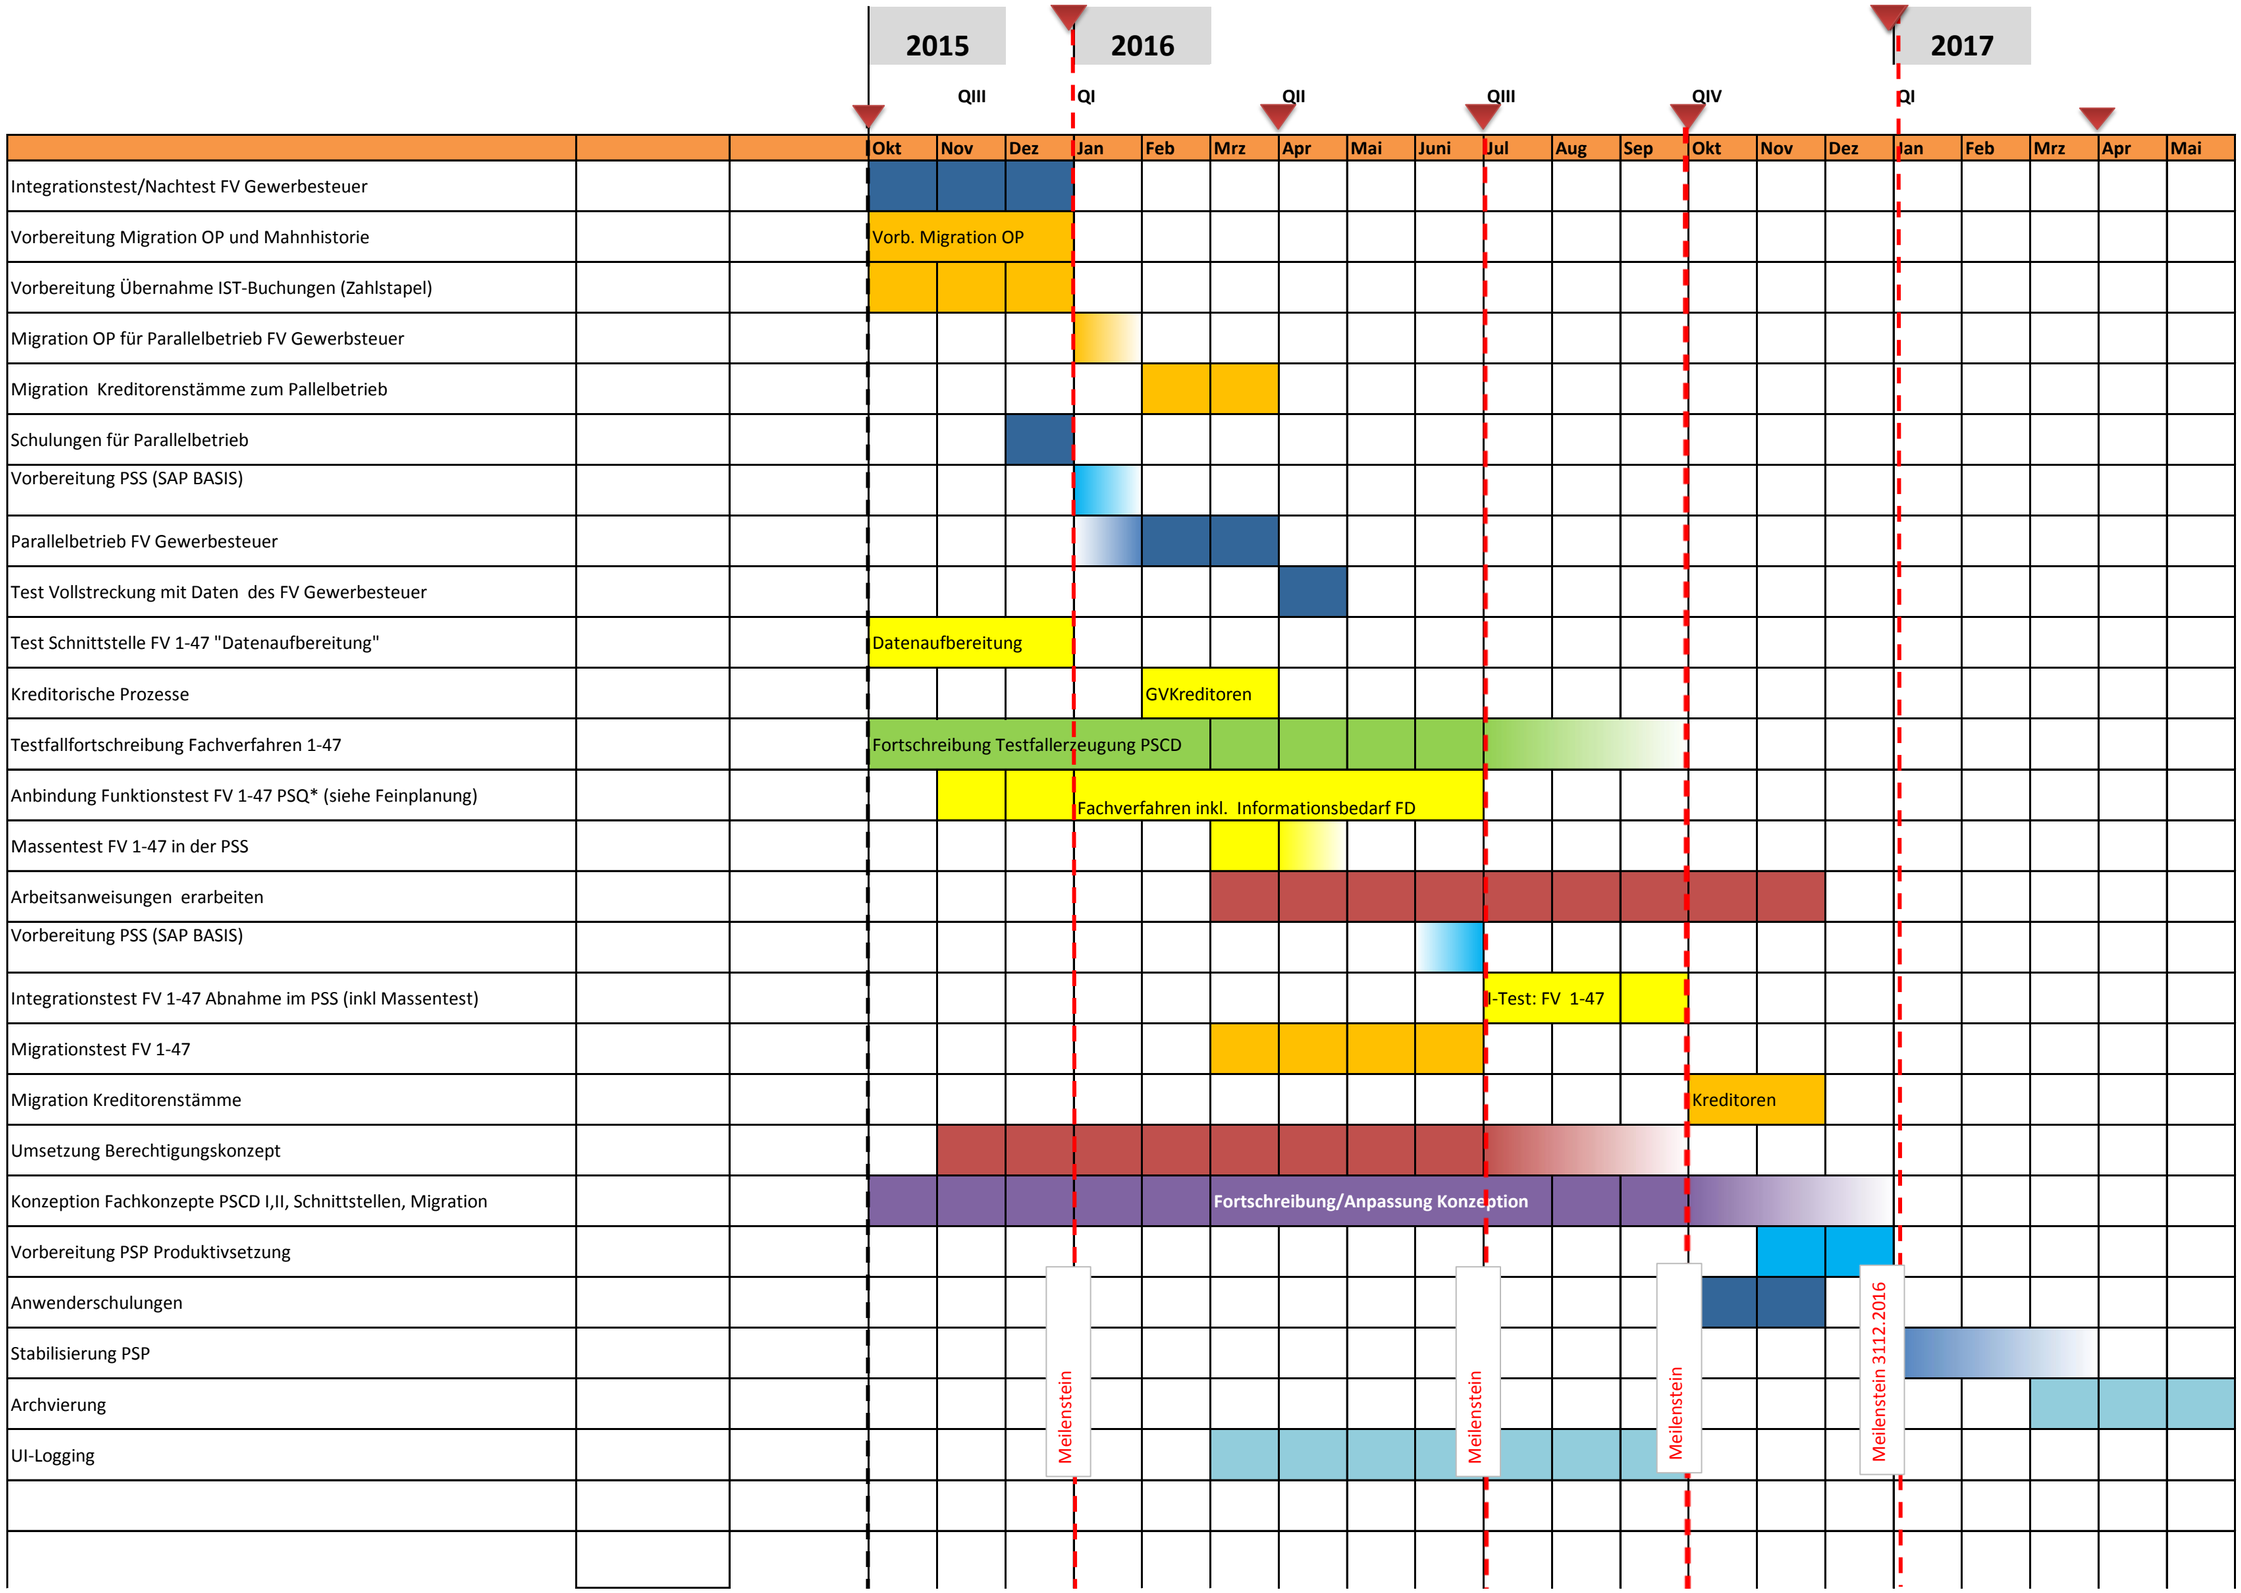
2015
2016
2017
QIII
QI
QII
QIII
QIV
QI
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
Integrationstest/Nachtest FV Gewerbesteuer
Vorbereitung Migration OP und Mahnhistorie
Vorb. Migration OP
Vorbereitung Übernahme IST-Buchungen (Zahlstapel)
Migration OP für Parallelbetrieb FV Gewerbsteuer
Migration Kreditorenstämme zum Pallelbetrieb
Schulungen für Parallelbetrieb
Vorbereitung PSS (SAP BASIS)
Parallelbetrieb FV Gewerbesteuer
Test Vollstreckung mit Daten des FV Gewerbesteuer
Test Schnittstelle FV 1-47 "Datenaufbereitung"
Datenaufbereitung
Kreditorische Prozesse
GVKreditoren
Testfallfortschreibung Fachverfahren 1-47
Fortschreibung Testfallerzeugung PSCD
Anbindung Funktionstest FV 1-47 PSQ* (siehe Feinplanung)
Fachverfahren inkl. Informationsbedarf FD
Massentest FV 1-47 in der PSS
Arbeitsanweisungen erarbeiten
Vorbereitung PSS (SAP BASIS)
Integrationstest FV 1-47 Abnahme im PSS (inkl Massentest)
I-Test: FV 1-47
Migrationstest FV 1-47
Migration Kreditorenstämme
Kreditoren
Umsetzung Berechtigungskonzept
Konzeption Fachkonzepte PSCD I,II, Schnittstellen, Migration
Fortschreibung/Anpassung Konzeption
Vorbereitung PSP Produktivsetzung
Anwenderschulungen
Stabilisierung PSP
Archvierung
UI-Logging
Meilenstein
Meilenstein
Meilenstein
Meilenstein 3112.2016
